

今後の作業予定

今後の主な作業とその予定は、次のとおりです

1. 鉛直磁気探査作業

土留め板を圧入する部分の安全を確認するために実施

- (1) 工事期間：平成16年9月13日～10月2日、日曜日を除く毎日午前8時から午後5時まで作業を行います。
- (2) 車両の通行：作業開始日に「4トトラック*3台、ワボックス*1台」で機材を搬入します。交通ルールを遵守するとともに決められた通行経路や時間等を遵守します。

2. 土止め圧入作業

掘削部分を他から分離、区画して安全に掘削するために実施

- (1) 工事期間：平成16年10月4日～10月16日、日曜日を除く毎日午前8時から午後5時まで作業を行います。
- (2) 車両の通行：作業開始に合わせて25tクレーン車*1車、圧入車、矢板搬送大型車で搬入します。「矢板搬送大型車」はその後2～3回に分けて搬入します。交通ルールを遵守するとともに決められた通行経路や時間等を遵守します。



3. 仮設物設置作業

仮囲い、事務所、作業場の整備
電気、水道の引き込み等を実施

- (1) 工事期間：平成16年9月10日～11月6日、日曜日を除く毎日午前8時から午後5時まで作業を行います。
- (2) 車両の通行：作業の詳細計画を行った後、報告しますが、造成工事のため相当量のダンプ車が入ります。交通ルールを遵守するとともに決められた通行経路や時間等を遵守します。

鉛直磁気探査作業

土留め板を圧入する部分の安全を確認するために「鉛直磁気探査」を行います

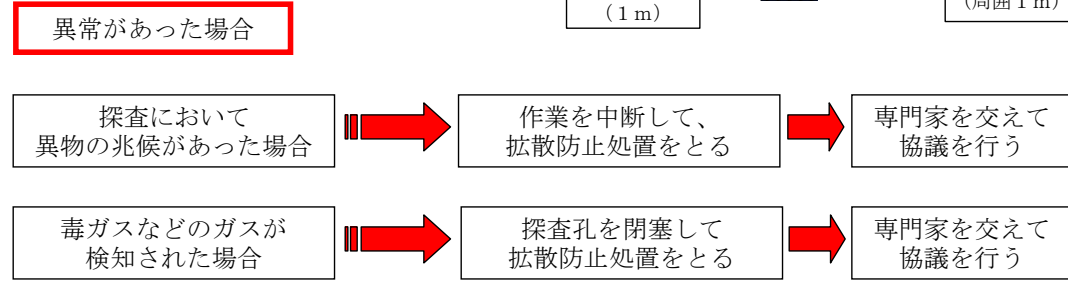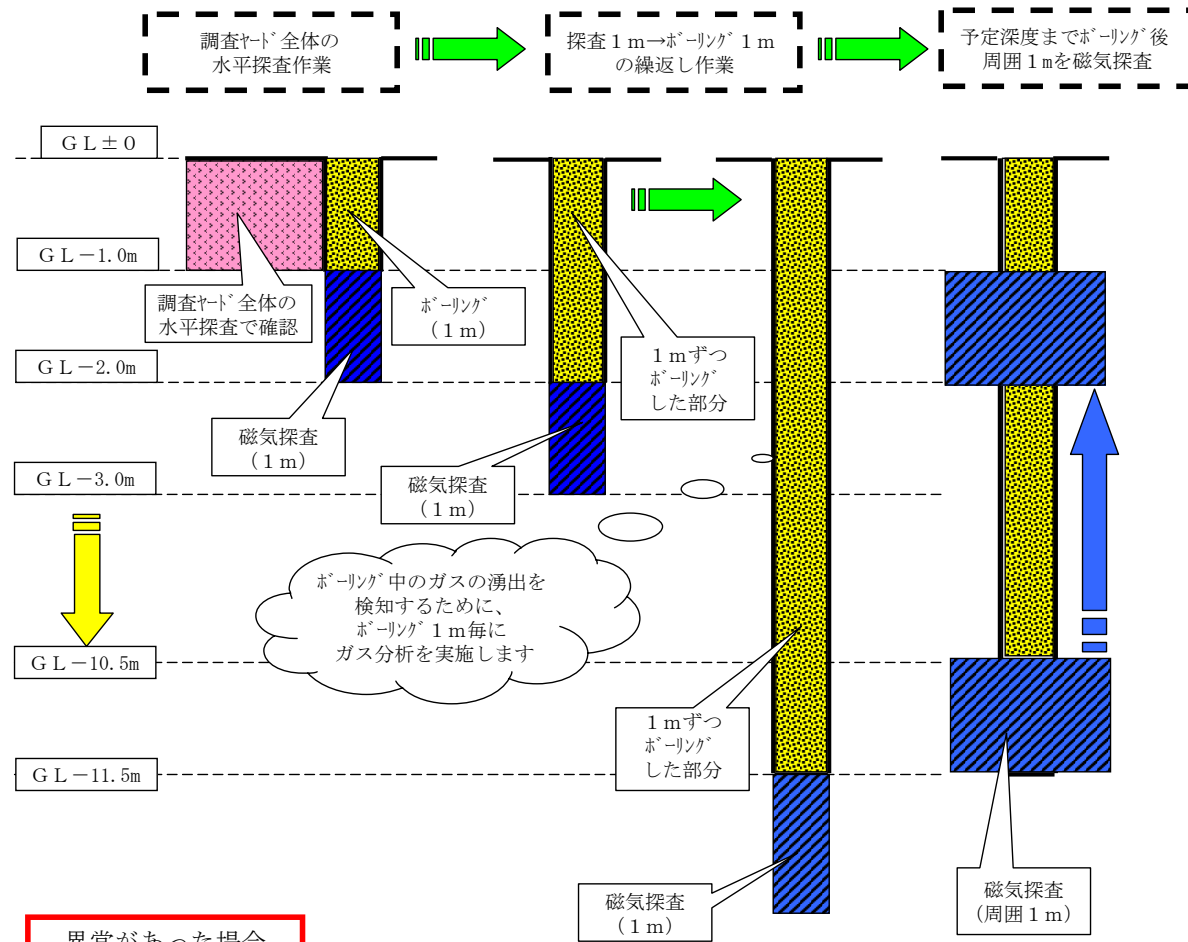

土留め用鋼矢板圧入作業

掘削部分を他から分離、区画して安全に掘削するために土留めを行います

